



إدارة المشاريع والصيانة

حفظه الله

فضيلة الدكتور الأمين العام لجمعية البر الأهلية بالرياض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد :

أسأل الله لفضيلتكم دوام التوفيق والسداد، يسرني أن ارفع تقرير للمشاريع الوقفية والاستثمارية العائدة للأمانة

العامة وفروعها والتي تم تنفيذها وماهو تحت التنفيذ ، كما هي مرفقة لفضيلتكم في البيان التالي:

م	اسم المشروع	الموقع	ملاحظات
١	مشروع الأمانة العامة	عليشة	جاري العمل
٢	مشروع وقف فرع معكال والشميسي	منفوحة	تم الانتهاء وجاري العمل على استخراج شهادة إتمام البناء
٣	مشروع فرع العريجات	العريجات	تم الانتهاء وجاري العمل على استخراج شهادة إتمام البناء
٤	مشروع فرع الروضة	الرمال	جاري العمل


هذا ما احببنا اطلاع فضيلتكم به.

والله يحفظكم ويرعاهم،،،

مدير إدارة المشاريع والصيانة المكلف

سعود بن عيضة الزهراني

عائدة بن يحيى  
تم اطلاع مدير إدارة المشاريع والصيانة  
بمحافظة الرياض  
١٤٤١/١٠/٢٦

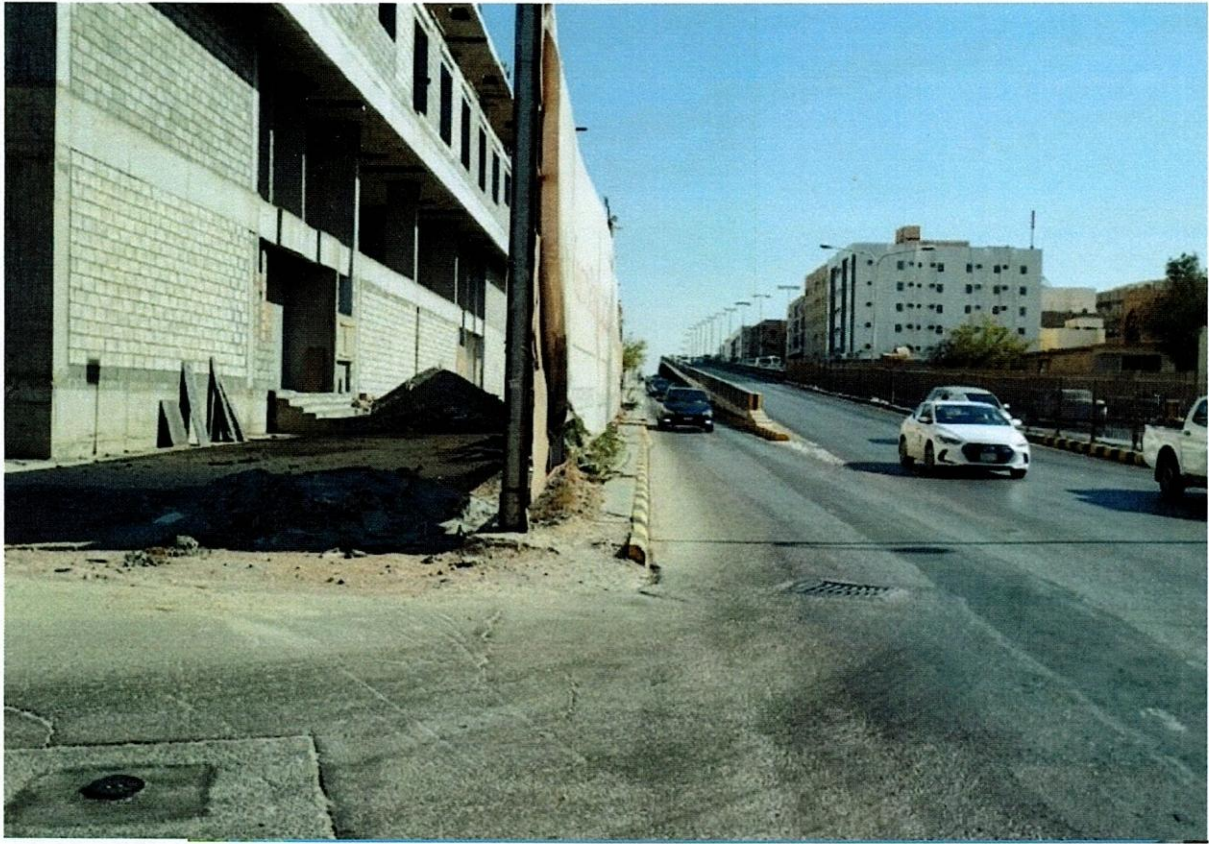

مشروع الأمانة العامة للجمعية  
بجى عليشه




مشروع الأمانة العامة للجمعية  
بجي عيشه



مشروع جمعية البر بالرياض  
( فرع العريجات )



جمعية البر الأهلية بالرياض فرع العريضة.

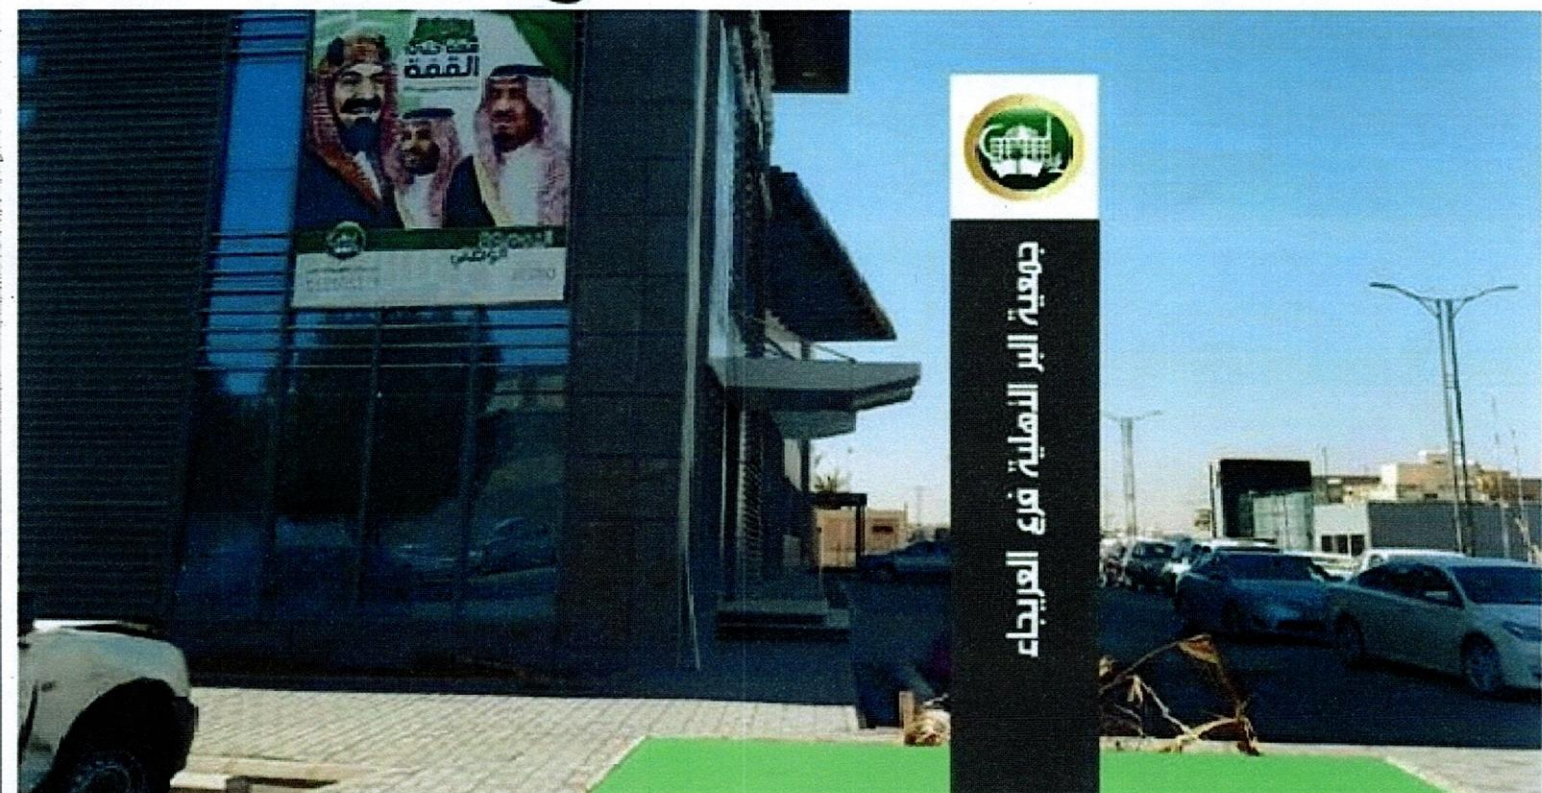



وقف جمعية البر  
الأهلية بالرياض  
(فرع معكال  
والشميسي).



وقف جمعية البر الأهلية بالرياض (فرع  
معكال والشميسي).




## مشروع جمعية البربحي الروضة







## مشروع جمعية البرحي الروضة

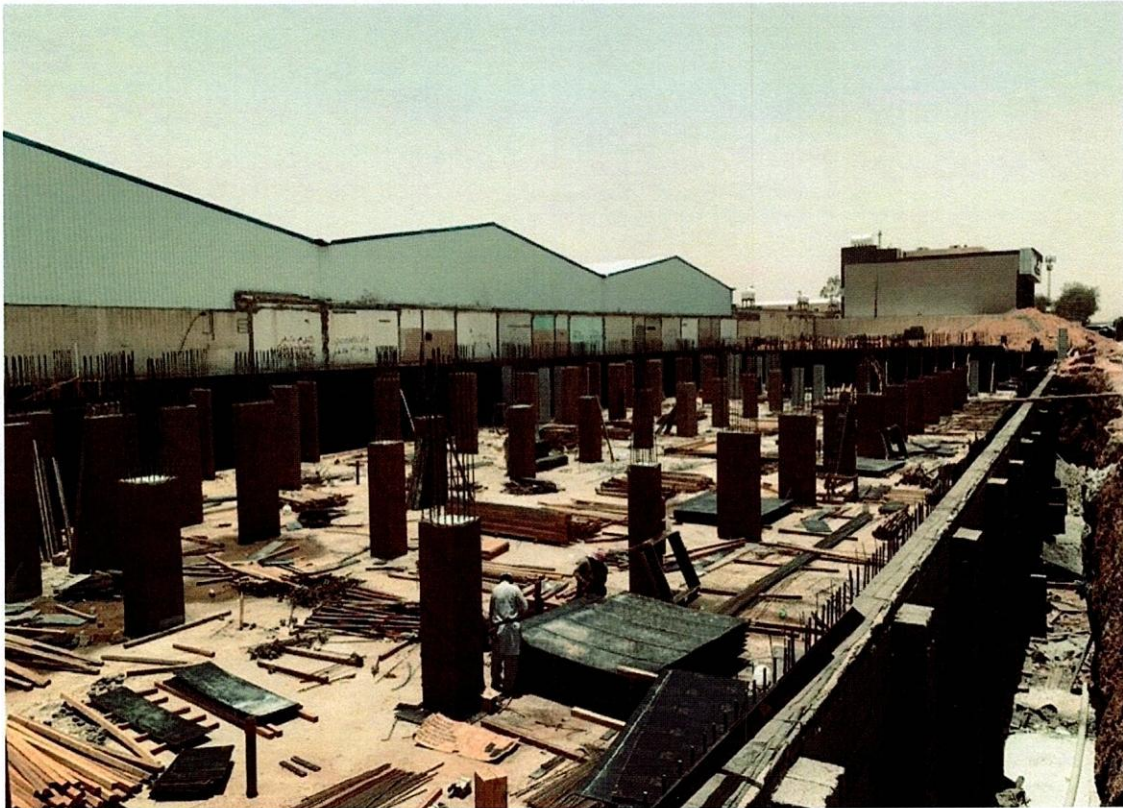



الرقم : ..... / ٤١ / هـ الموافق : ١٦ / ٢ / ٢٠٢٠ م

التاريخ : ٢٢ / ٦ / ١٤٤١ هـ المرفقات : - فواتير -

مراحل مشروع عمارة سكنية ومكتبية الخاص بالأمانة العامة للجمعية بجي عليشه:

جاري العمل بالمشروع ، وتم الانتهاء من الهيكل الخرساني (العظم) للقبو الأول

والثاني والدور الأرضي والأدوار الأول والثاني والثالث وجاري العمل على سقف

الدور الرابع.



الرقم : ..... / ٤١ / ص الموافق : ٢٠٢٠ / ٠٢ / ١٦ م

التاريخ : ٢٢ / ٠٦ / ١٤٤١ هـ المرفقات : ..... فواتير -

## مراحل مشروع عمارة تجارية مكتبية الخاصة بفرع الروضة بحي الرمال:

تم الانتهاء من صب اللبشة والخزانات قبل الحظر ، وتم الانتهاء من صب أعمدة القبو

يوم الاثنين الماضي ، وتم إنهاء حديد الجدران الاستنادية ، وجاري العمل على نجارة

الجدران الاستنادية ، ومنتوقع صباها يوم الثلاثاء القادم بإذن الله تعالى.

عبدالله الزهراني
